




REALIZZAZIONE NUOVO DEA OSPEDALE FAZZI

Stato di Avanzamento Lavori al 14 ottobre 2015



NUOVO DEA FAZZI: CRONOPROGRAMMA

reformulazione post proroga consegna a novembre 2015

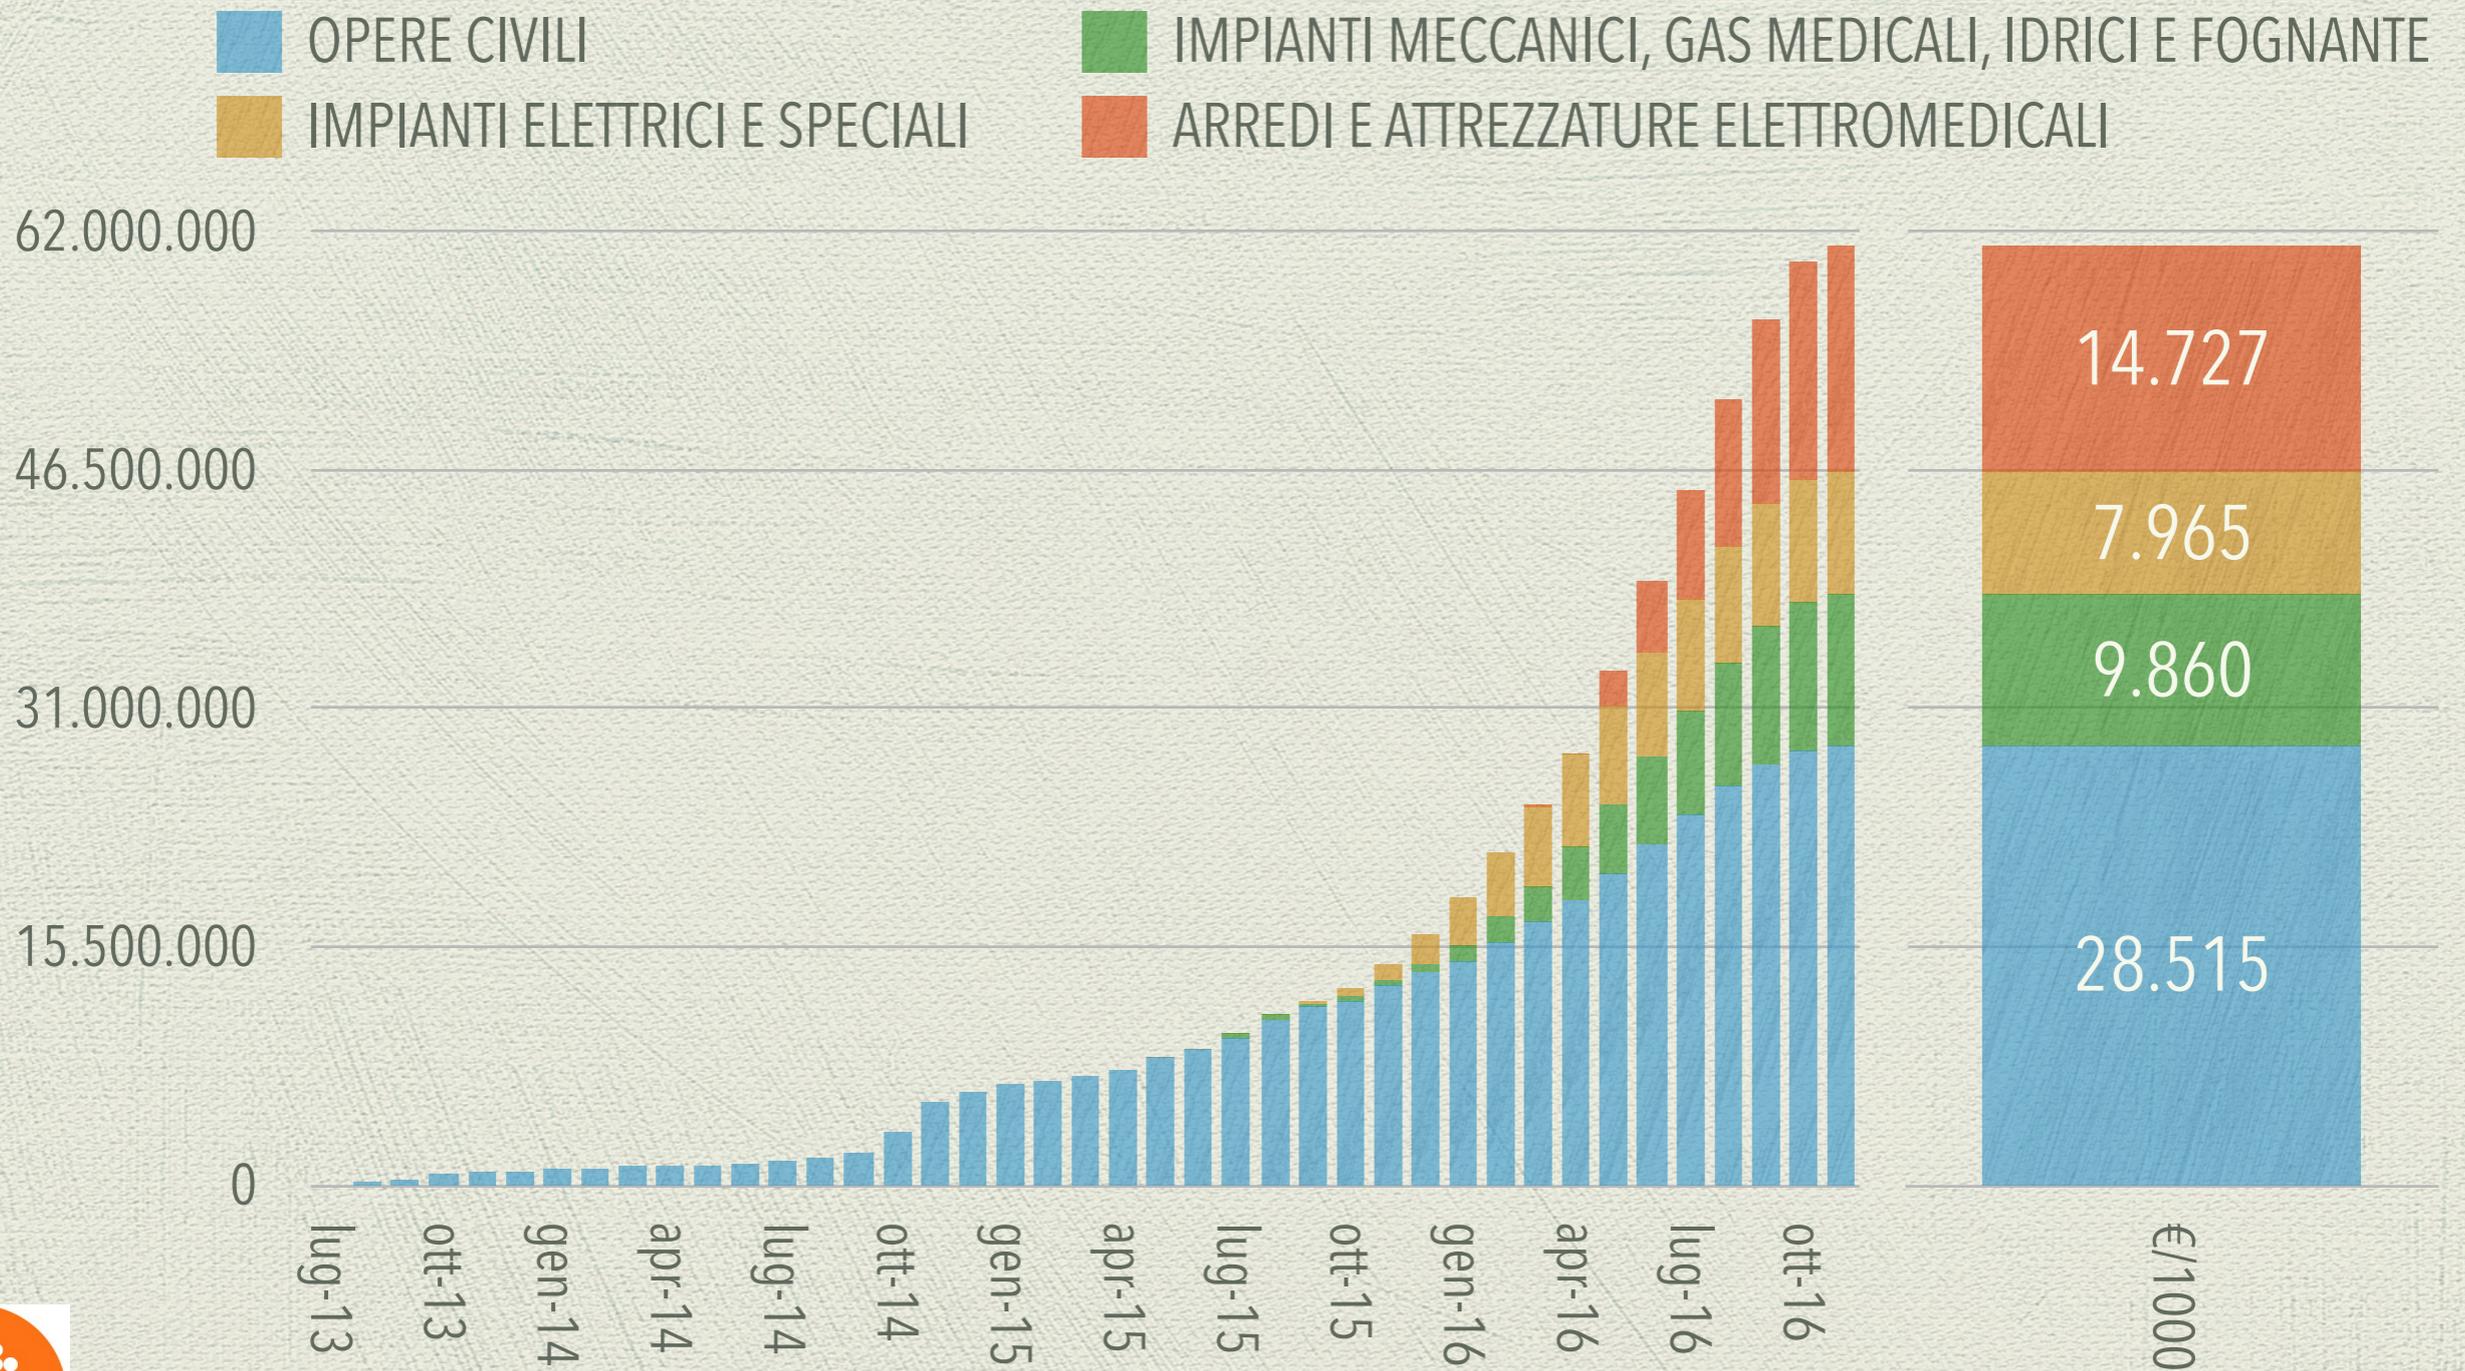

NUOVO DEA FAZZI: NODI SCIOLTI IN 9 MESI PER "RIMETTERE SUL SENTIERO IL PROGETTO"

1. AUMENTO DELLA PRODUZIONE MEDIA MENSILE DEL 95% (660mila VS 338mila)
2. RIPRISTINO DEL RAPPORTO ISTITUZIONALE E TECNICO CON GENIO CIVILE
3. RIDEFINIZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ E PAGAMENTO DEI LAVORI
4. VALUTAZIONE IN CONTRADDITTORIO DELLE RISERVE PREGRESSE
5. AUTORIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE VARIANTI PROGETTUALI PER
SOPRAVVENUTI OBBLIGHI DI LEGGE ED ESIGENZE LOGISTICHE
6. STUDIO E AFFIDAMENTO DEL MANDATO DI PROGETTAZIONE INTEGRATIVA PER
ELISUPERFICIE E VIABILITÀ
7. CONCESSIONE PROROGA DELLA CONSEGNA POST APPROFONDIMENTI DI
MERITO TECNICO E LEGALE



NUOVO DEA FAZZI: NODI SCIOLTI IN 9 MESI PER "RIMETTERE SUL SENTIERO IL PROGETTO"



GENNAIO 2015

OTTOBRE 2015

